

# Nayarit

## Tramo Tepic - Compostela



**Inversión:** 2,473.43 mdp



**Meta:** 28 km

- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gasas)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto



**Avance físico:**

- Programado: 100%
- Real: 66.21%
- Financiero: 60.31%



**Inicio:** Marzo 2023

**Término:** 15-Sep-2025



**2,900** empleos generados



**490 mil** habitantes beneficiados



**35 minutos** de ahorro en tiempo



Forma parte de la red de Autopista Jala-Puerto Vallarta, mejorará significativamente la conectividad local, regional e interestatal.



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



# Programa de continuidad (en proceso)

Autopista Tepic - Puerto Vallarta

Tramo Tepic - Compostela



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	<b>26.0 km</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Plaza de cobro</li><li>• 10 Puentes</li><li>• 2 PSFFC</li><li>• 19 Cruces (PSV's, PIV's ...)</li><li>• 1 Entronque</li></ul> <b>2.4 km</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ramal Aeropuerto</li></ul>	<b>17.21 km</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Puentes</li><li>• 8 cruces</li><li>• 1 PSFFC</li></ul> <b>0.0 km</b>	<b>8.79 km</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Plaza de cobro</li><li>• 6 Puentes</li><li>• 1 PSFFC</li><li>• 11 Cruces</li><li>• 1 entronque</li></ul> <b>2.4 km</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ramal Aeropuerto</li></ul>
Inversión (mdp)	<b>2,473.43</b>	<b>1,637.62</b>	<b>835.81</b>

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
La Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas en el estado de Nayarit se encuentra en proceso de integración de 2 carpetas de investigación, para ello, Secretaría, FONDO y CMRO han coordinado acciones a efecto de aportar la información requerida por la Fiscalía. Cabe señalar, que en los recorridos realizados no se detectaron indicios relacionados con personas desaparecidas.	Se pudo constatar que la zona en que se realizó la visita se encuentra fuera del Derecho de Vía.

## Maquinaria: 84

- Grúa titán
- Excavadoras
- Bulldozer
- Perforadora
- Grúa
- Vibrocompactador
- Motoconformadora
- Minicargador
- Petrolizadora
- Otros equipos menores

## Fuerza de Trabajo:


496 personas



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

# Nayarit

## Tramo Tepic - Compostela

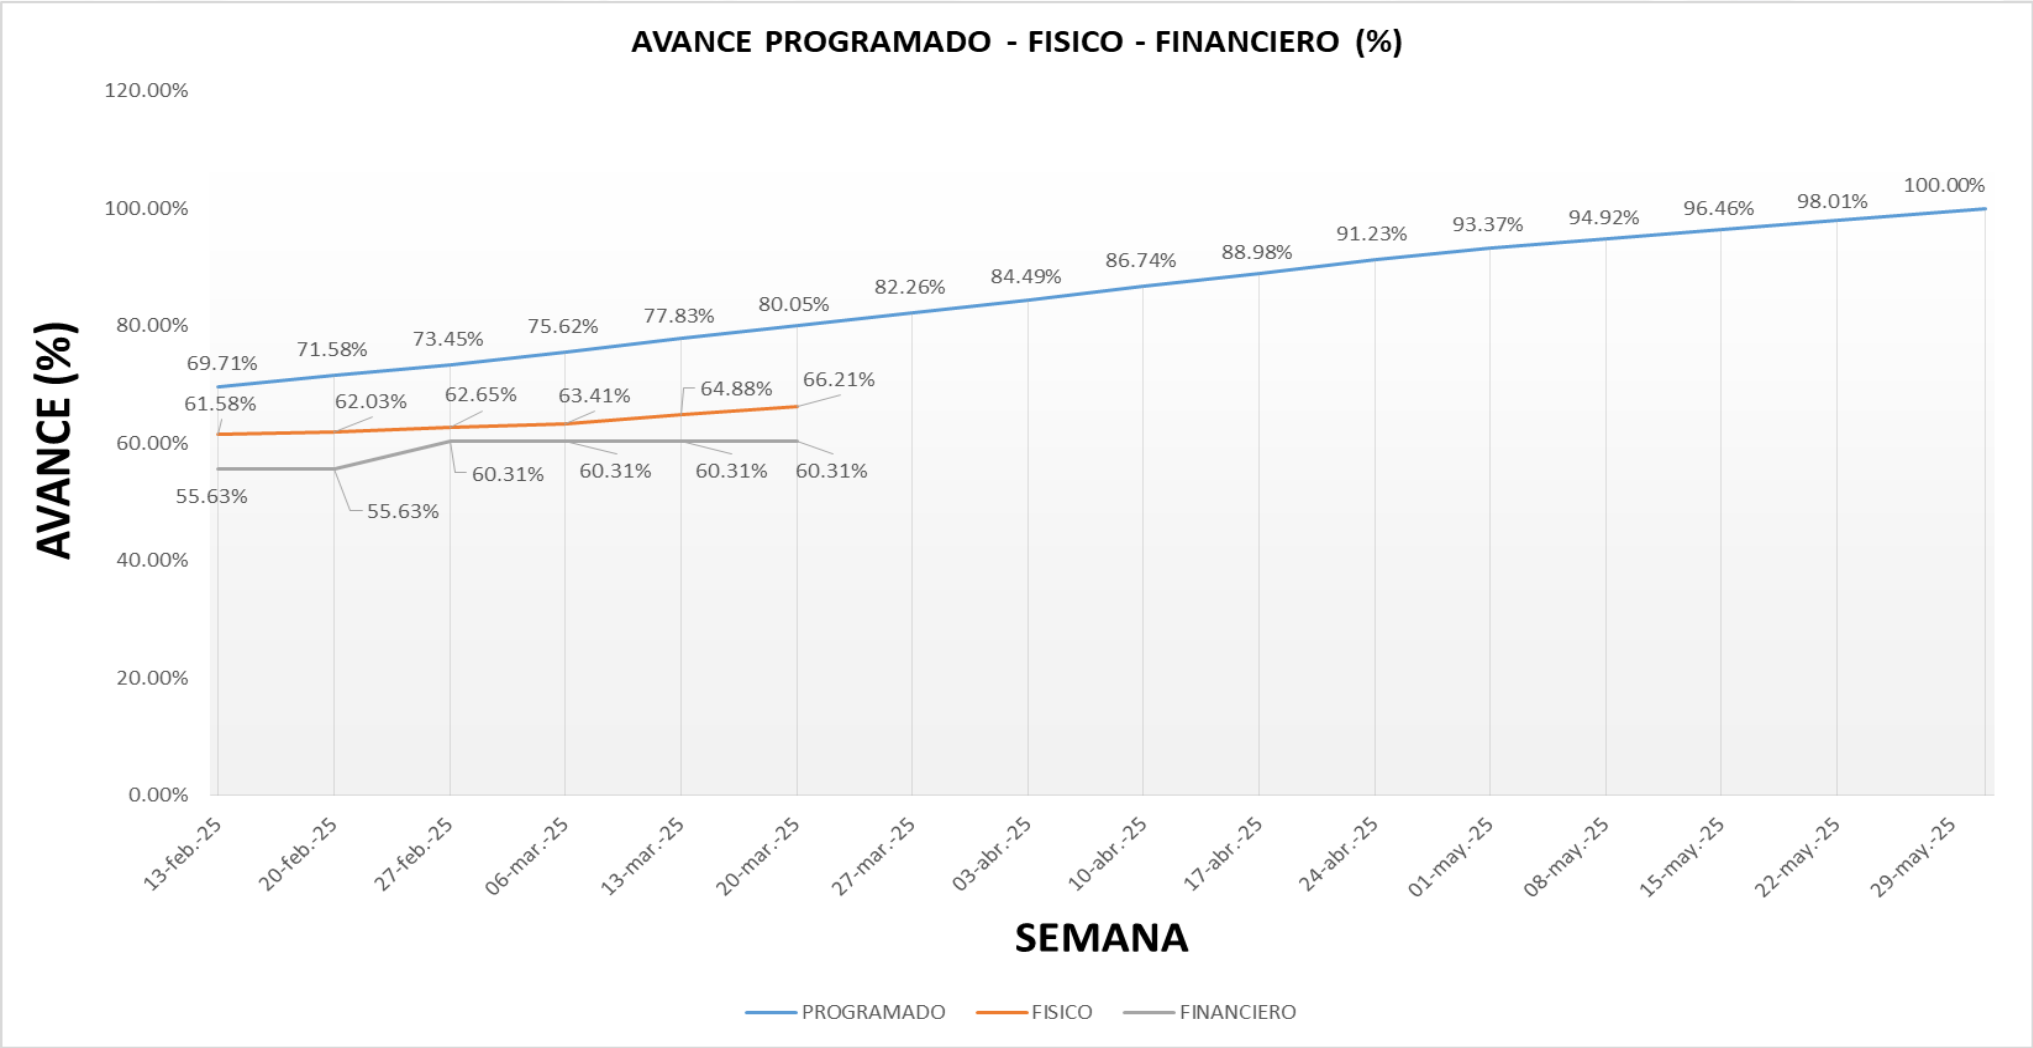




# Nayarit

## Tramo Tepic - Compostela



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

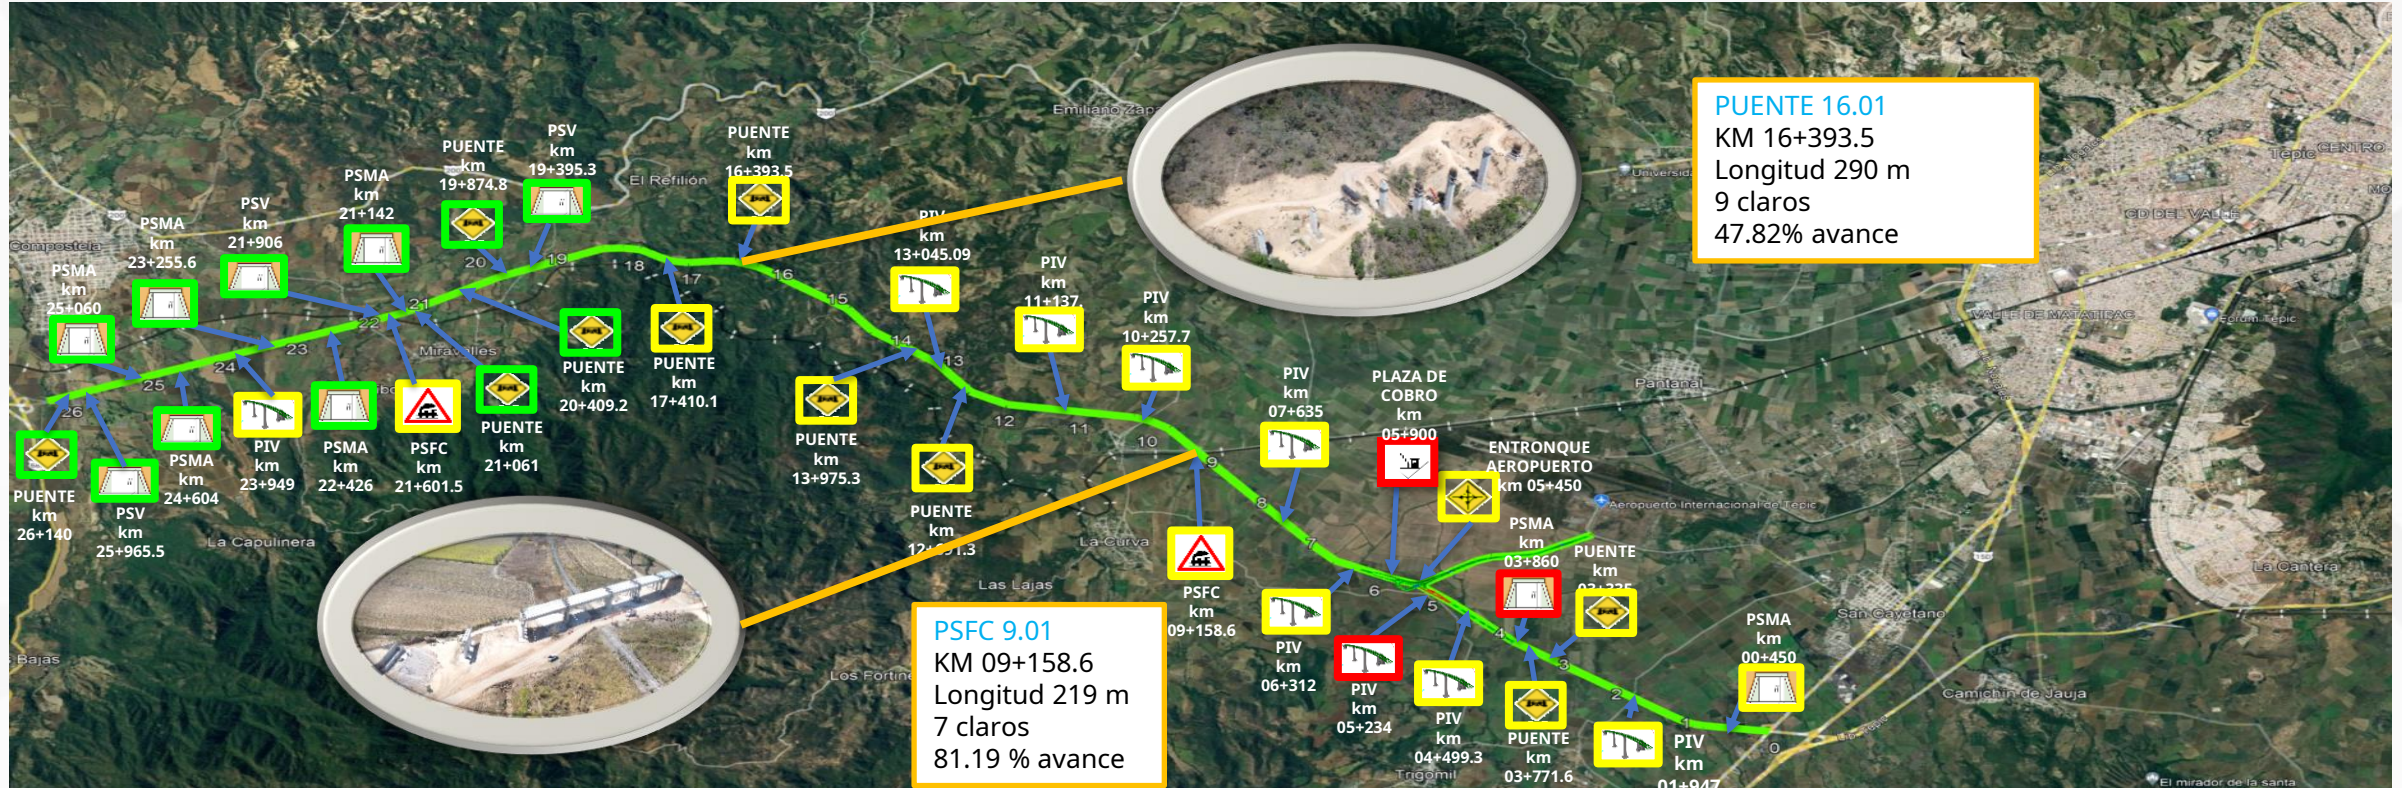

10 Puentes



1 Entronque



9 P.I.V.



2 PSFCC



1 Plaza de Cobro



3 P.S.V.



7 P.S.M.A.



Construido



En construcción



Por construir

**Avance físico Tepic-Compostela**  
Real: 66.21 %

CONTRATISTA: CMRO NAYARIT, S.A.P.I. DE C.V.  
CONTRATO: BNO-APP-006-G1C003-E1-2022
