

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión: 4,575.3 mdp



Meta: 71.3 Km



Avance físico:

- Programado: 37.55%
- Real: 32.83%
- Financiero: 0.00%
-



Inicio: 27 de enero de 2024

Término: 30 de enero de 2027



4,800 empleos generados



126,000 mil habitantes beneficiados



• **Ahorro en Tiempo:** 25 min

• **TDPA:** 16,113 (2023)

• **Población beneficiada:** 453,546 habitantes



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Construcción de ampliación de corona (Km 36+500 – Km 37+500) ,Tramo 4

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	71.3 Km	27.90 km (equivalente)	44.46 km (equivalente)
Inversión (mdp) inc. I.V.A.	\$ 4,575.30	\$ 1,502.04	\$ 3,073.25

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
Falta de acarreo por conflictos entre sindicatos e intervención de civiles.	Secretaría autoriza la solicitud de reprogramación de los tramos; y gobierno del estado reforzó la seguridad en los tramos en modernización.
Solicitud de diversas obras sociales por las comunidades.	Se han estado revisando en forma conjunta (Secretaría y Concesionaria) para ver las que se puedan autorizar y realizar los proyectos ejecutivos correspondientes.

Maquinaria: 181

- Equipos menores y mayores
- Excavadoras
- Perforadoras
- Tractores
- Compactadores
- Tren de pavimentación

Fuerza de Trabajo:

276 personas

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío



TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 21 mar al 27 mar 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	578,072.42	127,485.58	4,648.38	2,435.25	
Terraplén (m3)	441,517.00	240,721.09	200,795.91	7,864.50	2,693.65	• Cambio de composición en estratificación en cortes.
Subyacente (m3)	256,174.00	186,565.15	69,608.85	3,487.64	1,377.20	• Se realizará cambio de maquinaria para continuar con trabajos.
Subrasante (m3)	174,781.00	119,686.02	55,094.99	2,882.11	1,030.30	



Corte en rectificación de trazo en Km 39+600



Conformación de subrasante en ampliación de corona en Km 50+360

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío



PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 21 mar al 27 mar 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	50,126.18	75,532.87	0.0	0.0	
Bacheo (m3)	1,800.00	338.50	1,461.50	0.0	0.0	
Fresado (m3)	10,676.00	8,079.31	2,596.69	0.0	0.0	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	5.01	25.23	0.0	0.0	
Geomalla (m2)	84,520.00	10,449.60	74,070.40	404.31	2,916.00	Rendimientos mayores a los programados
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	57,290.58	63,123.47	1,419.02	2,276.94	Rendimientos mayores a los programados
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	12,632.00	32,615.80	571.82	0.00	En proceso de montaje de nueva Planta (JUNGAPEO), para continuar trabajos



Tendido de base asfáltica en Km 51+000.



Conformación de base hidráulica en Km 50+900.

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío



OBRAS DE DRENAJE								
Concepto	Total	Concluidas	En proceso	Canceladas	Sin iniciar	Del 21 mar al 27 mar 25		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
ODT	123.00	28.00	38.00	10.00	47.00	0.0	0.0	



Obra de drenaje (sifón invertido) en Km 34+000.



Construcción de PSMA en Km 36+000.

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro - Maravatío



ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 21 mar al 27 mar 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	0.66	0.34	0.05	0.05	
PIV JUNGAPEO	1.00	0.46	0.54	0.00	0.03	
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.04	0.96	0.00	0.04	
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.05	0.95	0.00	0.03	



Armado de cabezal de apoyo 01 Puente Turundeo Km 36+500.




Armado de columnas de apoyo 03 Puente Turundeo Km 36+500.



Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

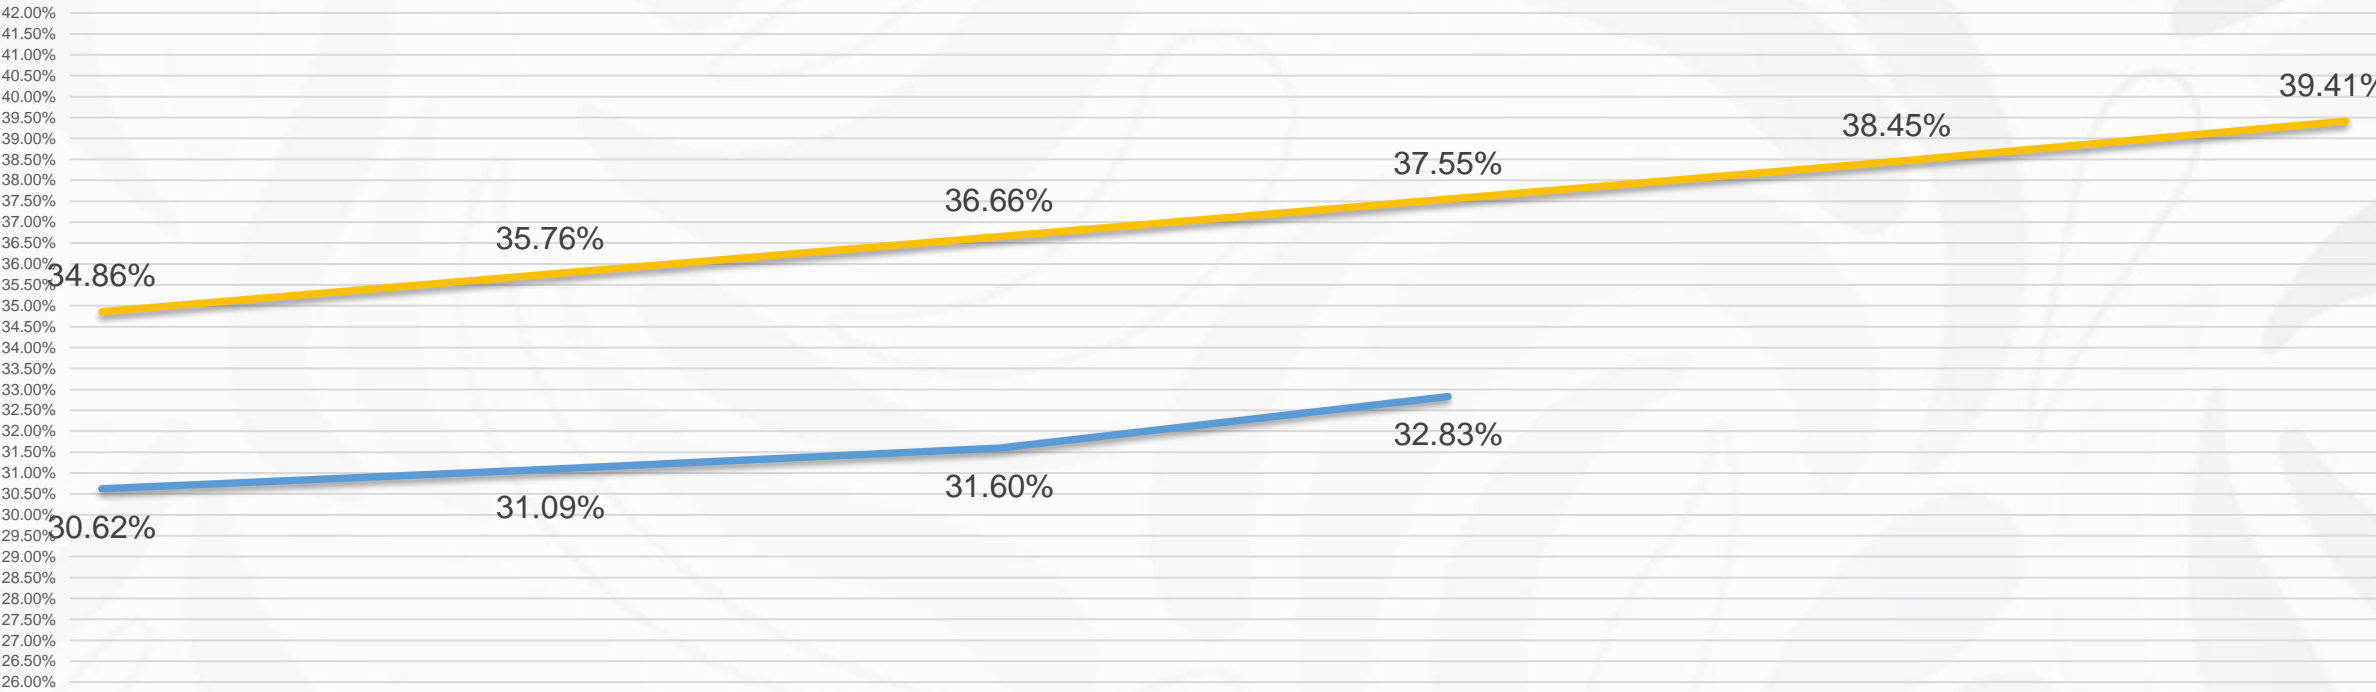

	02 mar 25	09 mar 25	16 mar 25	23 mar 25	30 mar 25	06 abr 25
Programado Acumulado	\$1,594,899,750.02	\$1,635,997,167.81	\$1,677,094,585.59	\$1,718,192,003.38	\$1,759,289,421.16	\$1,803,329,569.77
Físico Acumulado	\$1,401,126,640.68	\$1,422,421,602.82	\$1,445,733,220.85	\$1,502,043,449.13		
Financiero Acumulado	\$-	\$-	\$-			
Programado % Acumulado	34.86%	35.76%	36.66%	37.55%	38.45%	39.41%
Físico % Acumulado	30.62%	31.09%	31.60%	32.83%		
Financiero % Acumulado	0.00%	0.00%	0.00%			

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío



Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

