

Nayarit Tepic-Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión: 2,473.43 mdp



Meta: 28 km

- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gasas)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto



Avance físico:

- Programado: 100%
- Real: 64.88%
- Financiero: 60.31%



Inicio: Marzo 2023

Término: 31-Oct-25



2,900 empleos generados



490 mil habitantes beneficiados



35 minutos de ahorro en tiempo



Forma parte de la red de Autopista Jala-Puerto Vallarta, mejorará significativamente la conectividad local, regional e interestatal.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Programa de continuidad (en proceso)

Autopista Tepic-Puerto Vallarta

Tramo Tepic-Compostela

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	26.0 km <ul style="list-style-type: none"> • 1 Plaza de cobro • 10 Puentes • 2 PSFFC • 19 Cruces (PSV's, PIV's ...) • 1 Entronque 2.4 km <ul style="list-style-type: none"> • Ramal Aeropuerto 	16.87 km <ul style="list-style-type: none"> • 4 Puentes • 8 cruces • 1 PSFFC 0.0 km	9.13 km <ul style="list-style-type: none"> • 1 Plaza de cobro • 6 Puentes • 1 PSFFC • 11 Cruces • 1 entronque 2.4 km <ul style="list-style-type: none"> • Ramal Aeropuerto
Inversión (mdp)	2,473.43	\$1,604.81	868.62

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
<p>La Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas en el estado de Nayarit se encuentra en proceso de integración de 2 carpetas de investigación, para ello, Secretaría, FONDO y CMRO han coordinado acciones a efecto de aportar la información requerida por la Fiscalía.</p> <p>Cabe señalar, que en los recorridos realizados no se detectaron indicios relacionados con personas desaparecidas.</p>	<p>Se pudo constatar que la zona en que se realizó la visita se encuentra fuera del Derecho de Vía.</p>

Maquinaria: 84


- Grúa titán
 - Excavadoras
 - Bulldozer
 - Perforadora
 - Grúa
 - Vibrocompactador
- Motoconformadora
 - Minicargador
 - Petrolizadora
 - Otros equipos menores

Fuerza de Trabajo:

496 personas




Avance Programado-Físico-Financiero (%)

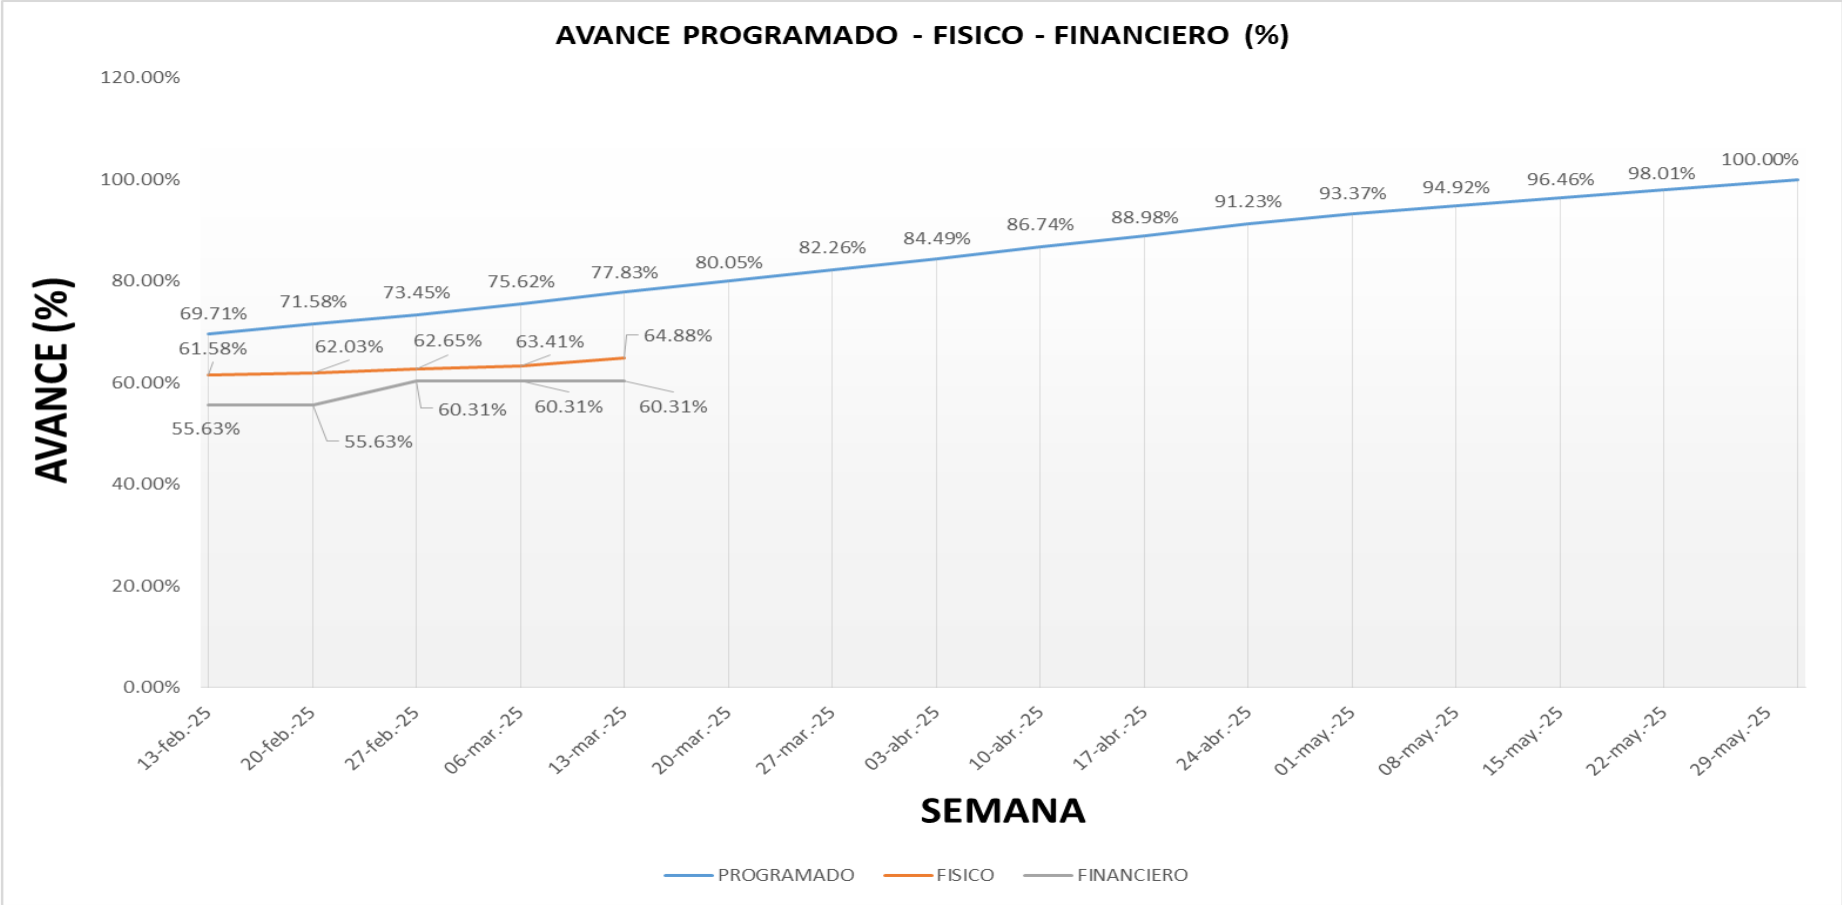

Tramo Tepic-Compostela



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

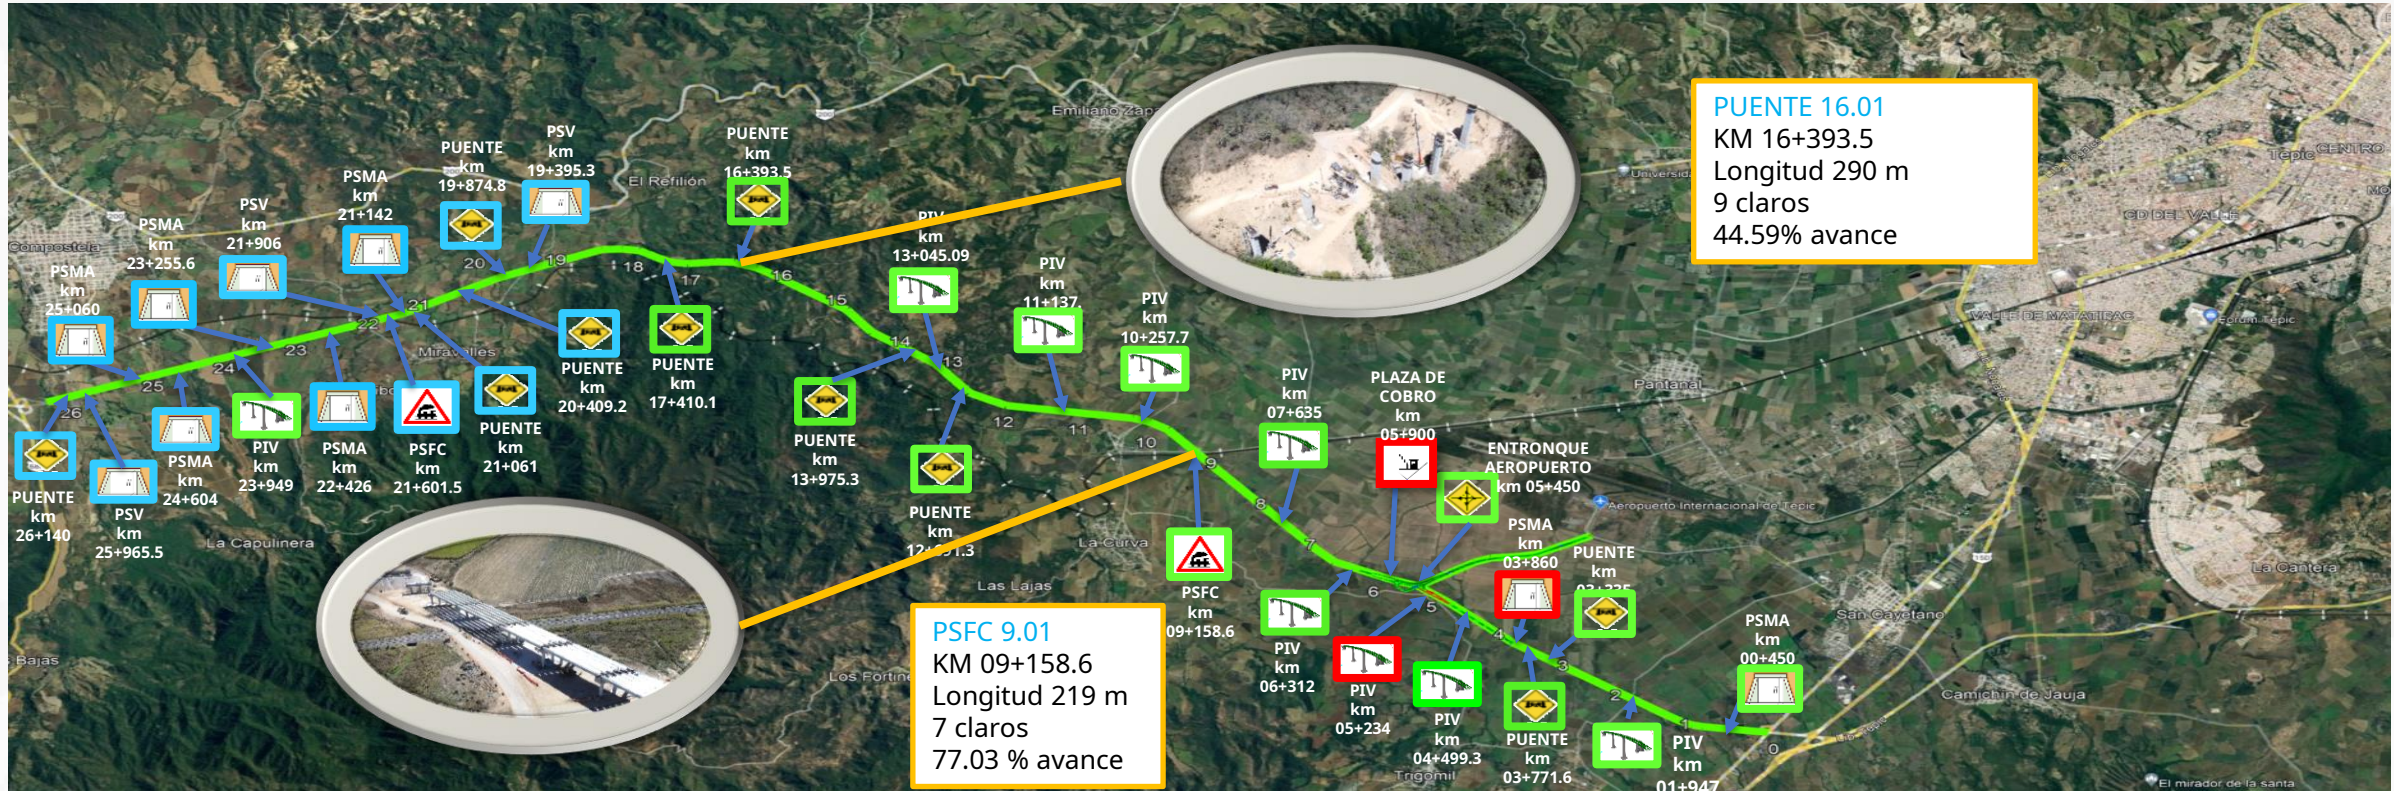

2025
Año de
La Mujer
Indígena




10 Puentes



2 PSFFCC



1 Entronque



1 Plaza de Cobro



9 P.I.V.



3 P.S.V.

7 P.S.M.A.

Construido

 En construcción

Por construir

Avance físico Tepic-Compostela
Real: 64.88 %

CONTRATISTA: CMRO NAYARIT, S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATO: BNO-APP-006-G1C003-E1-2022
