

Chiapas

Entronque San Cristóbal



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión: 44.96 mdp



Meta: 1 Entronque



Avance físico:

- Real: 25.17%
- Financiero: 22.96%



Inicio:
Término: Por definir



135 empleos generados



200,000 mil habitantes beneficiados



- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Programa de continuidad

Entronque San Cristóbal



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| Problemática que impida concluir la obra | Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI |
|---|---|
| La Concesionaria presento a la SICT, propuesta de modificación al proyecto ejecutivo del Entronque San Cristóbal. | <ul style="list-style-type: none">Actualmente, continua en revisión la propuesta de modificación al proyecto del Entronque por parte de la DGST. |
| Programa de ejecución en suspensión temporal desde el 31 de octubre de 2024 por modificación del proyecto. | <ul style="list-style-type: none">Una vez que se apruebe la modificación propuesta por la Concesionaria al proyecto del entronque San Cristóbal, se tendrán 4 meses para concluir los trabajos. |

Maquinaria: 0

Fuerza de Trabajo: 0

Maquinaria: 0

Fuerza de Trabajo:
0 personas

| | Alcance | Avances | ¿Qué falta? |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Meta | "Obras de Ampliación del tramo 3", consistente en la construcción de un Entronque que permita una conexión vial y el flujo de vehículos en diferentes direcciones. Su diseño y funcionamiento adecuados son fundamentales para garantizar la movilidad y la seguridad en el sistema de transporte. | 0.25 km (equivalente) | 0.75 km (equivalente) |
| Inversión (mdp) inc. I.V.A. | 44.96 | | |






2025
Año de
La Mujer Indígena

Chiapas


Entronque San Cristóbal

| Tramos | Fecha de Término | Avance físico Programado 13/02/25 | Avance físico real al 29/01/25 | Avance físico real al 05/02/25 | Avance por actividad (05/02/25) | Rendimiento Real (05/02/25) | Observaciones | Indicador |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|-----------|
| Gasa 50 | Indefinido | 0.00% | 35.0 % | 35.0 % | <ul style="list-style-type: none"> No presenta actividades | | <ul style="list-style-type: none"> Programa de ejecución en suspensión temporal desde el 31 de octubre de 2024 por modificación del proyecto, actualmente continua en revisión la propuesta de modificación por parte de la DGST. | |
| Gasa 20 | Indefinido | 0.00% | 98.52% | 98.52% | <ul style="list-style-type: none"> No presenta actividades | | <ul style="list-style-type: none"> Una vez que se apruebe, se tendrán 4 meses para concluir los trabajos. | |
| Gasa 2 | Indefinido | 0.00% | 17.5% | 17.5% | <ul style="list-style-type: none"> No presenta actividades | | | |
| Gasa 40 | Indefinido | 0.00% | 0.00% | 0.00% | <ul style="list-style-type: none"> No presenta actividades | | | |
| Gasa 30 | Indefinido | 0.00% | 0.00% | 0.00% | <ul style="list-style-type: none"> No presenta actividades | | | |
| Glorieta a nivel de piso | Indefinido | 0.00% | 0.00% | 0.00% | <ul style="list-style-type: none"> No presenta actividades | | | |

-  hasta el 5% por debajo de lo programado
-  hasta el 10% por debajo de lo programado
-  20% o más por debajo de lo programado



Avance Programado - Físico - Financiero (%)

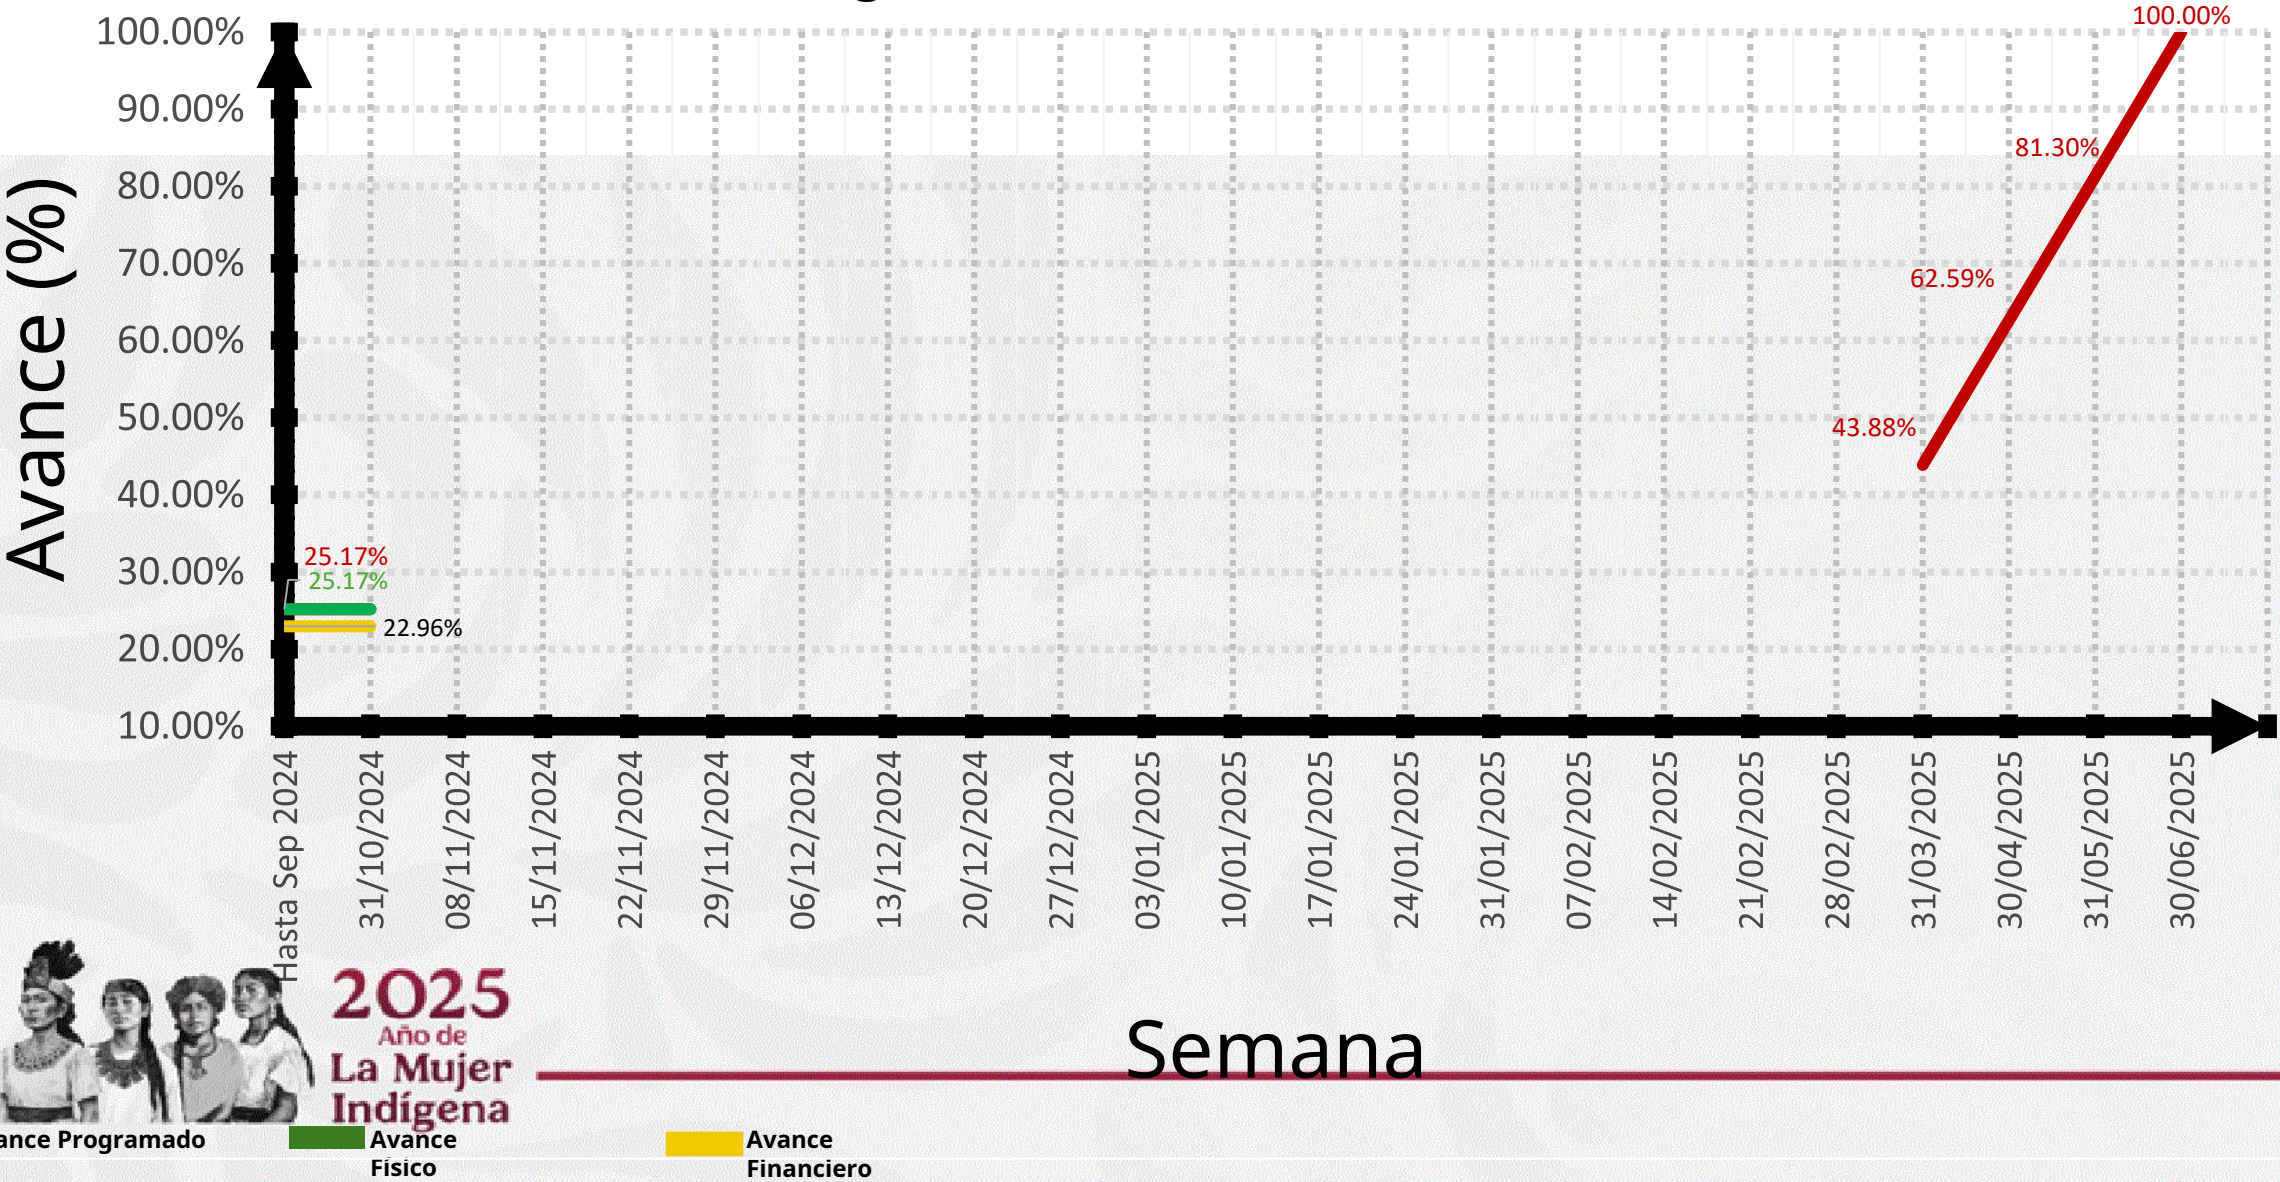


Chiapas

Entronque San Cristóbal




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

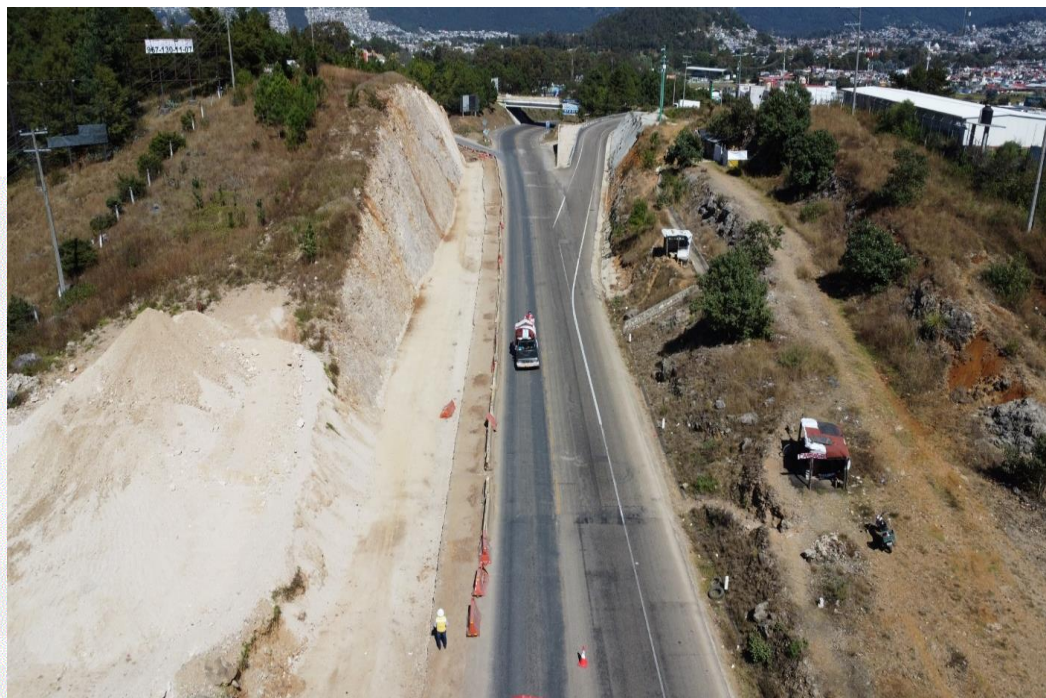

Gasa 50, no presenta actividades.

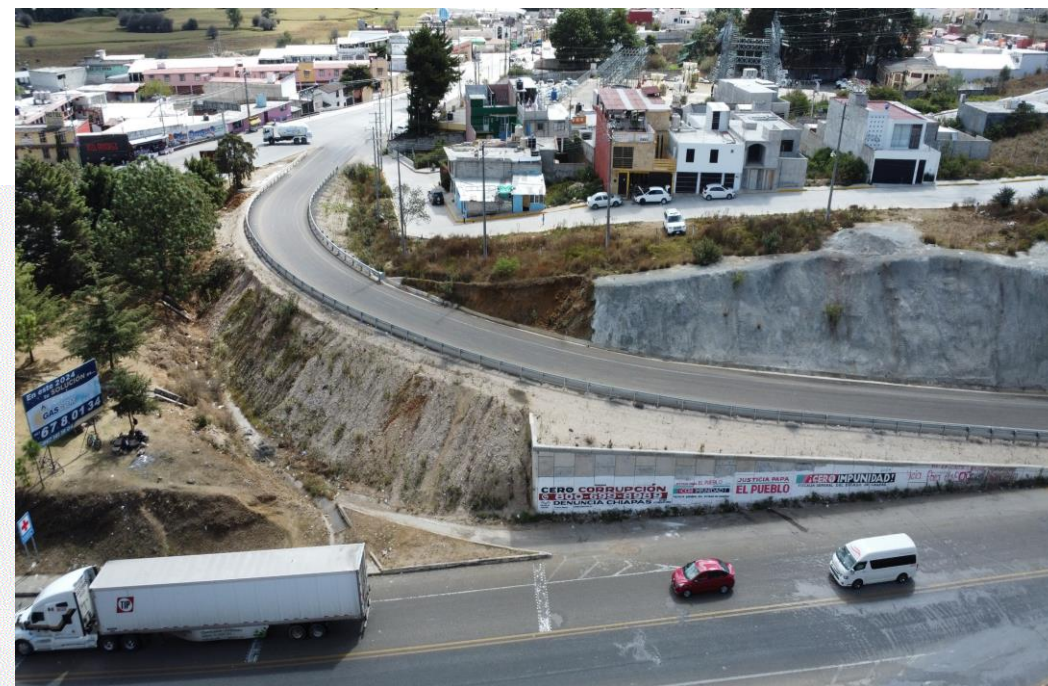

Gasa 20, no presenta actividades



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**


Chiapas

Entronque San Cristóbal



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

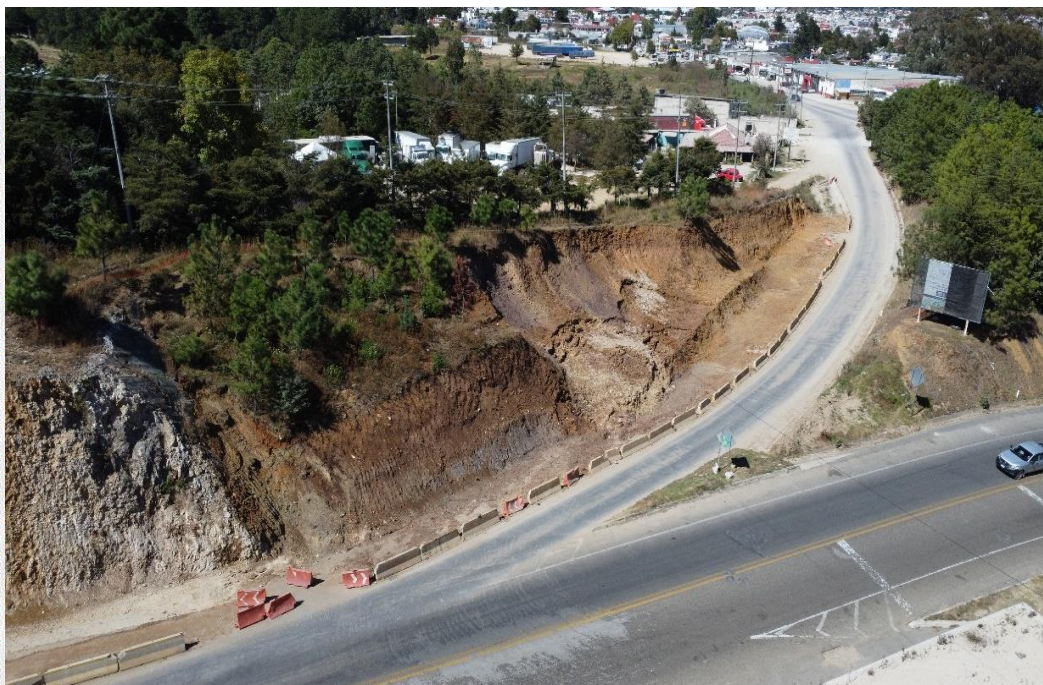

Gasa 2, no presenta actividad



Glorieta a nivel de piso, no presenta actividad.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Entronque San Cristóbal

Avances físicos gasa 50, 20 y 2 (no hubo actividades)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Octubre 2024



Noviembre 2024



Diciembre 2024



Enero 2025



Chiapas


Entronque San Cristóbal



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

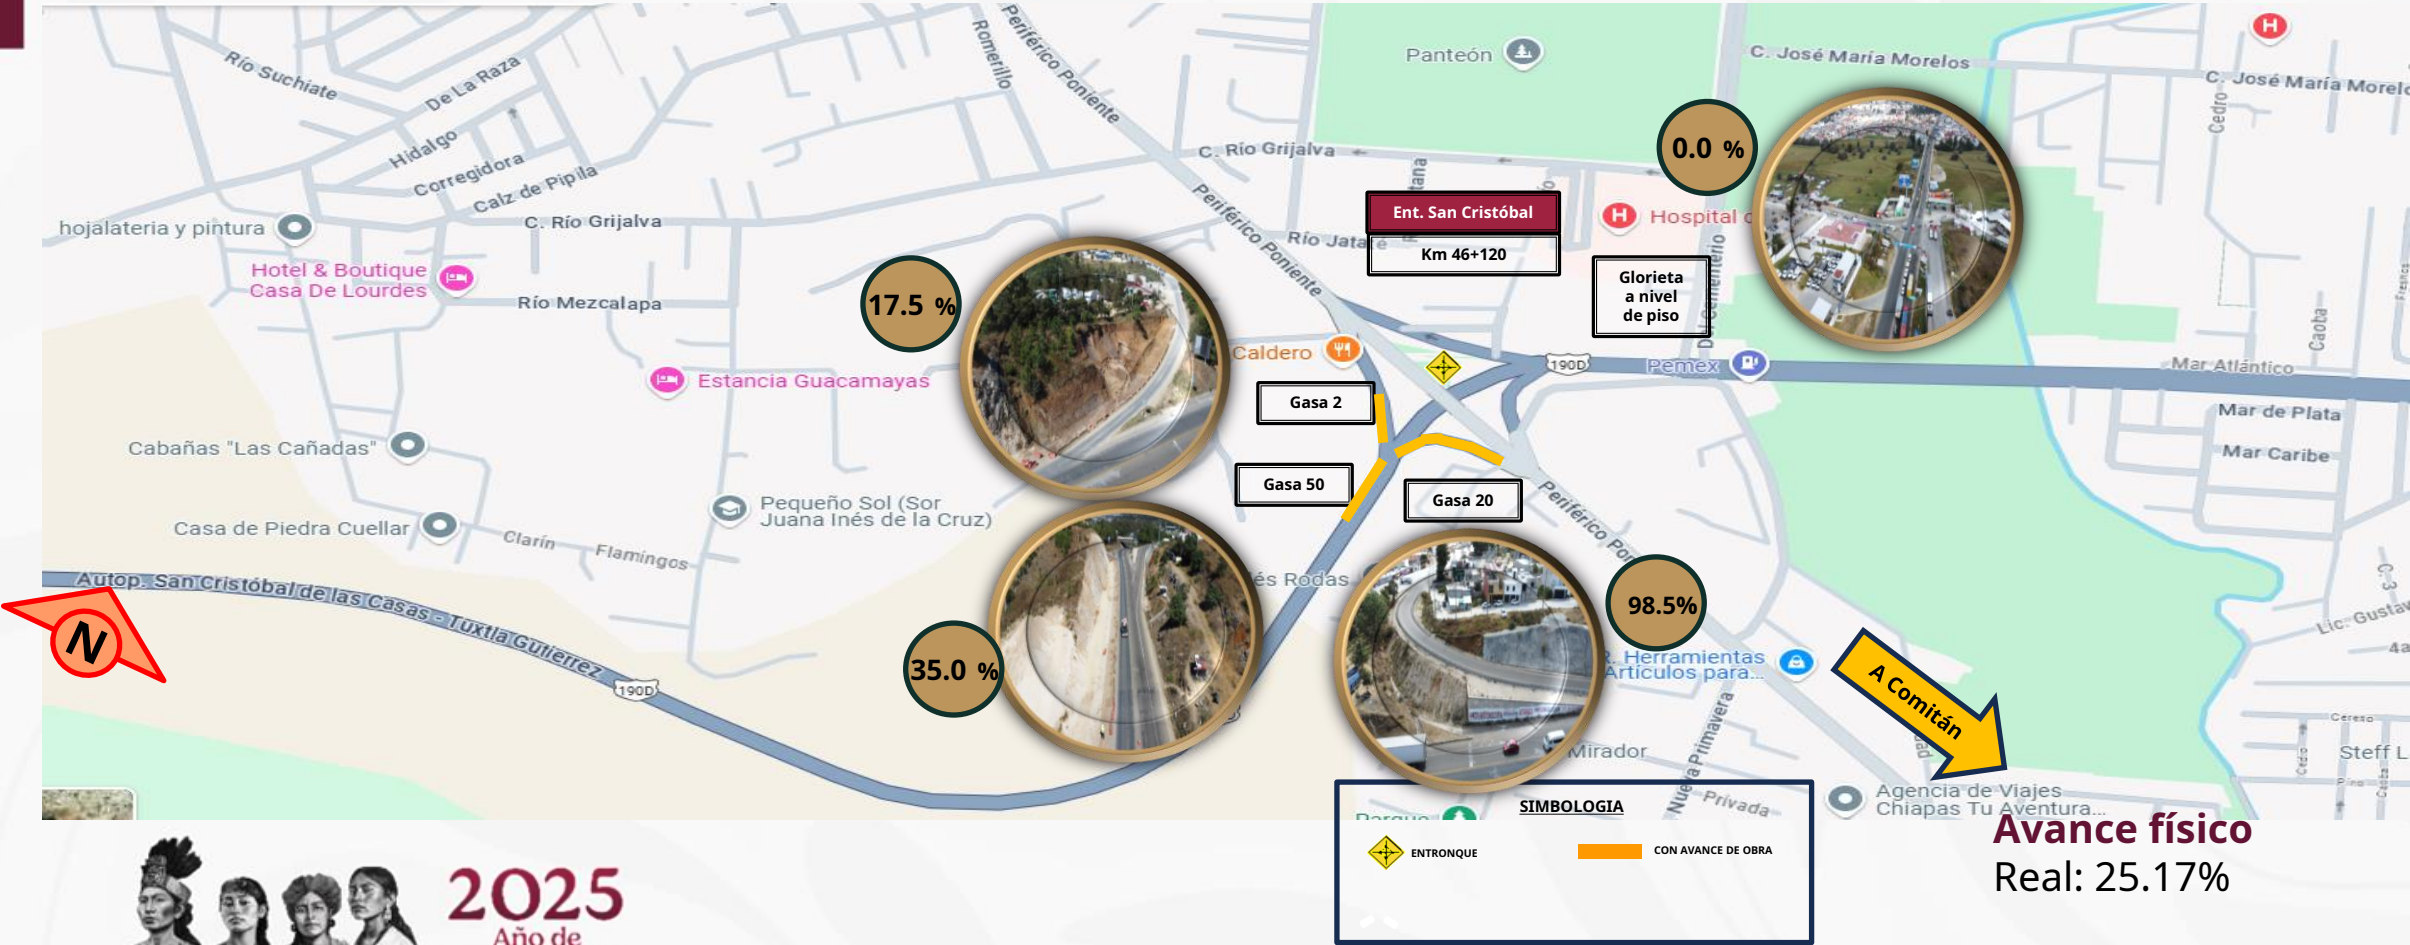

2025
Año de
La Mujer Indígena
