
Oaxaca Mitla-Entronque Tehuantepec II







Avance físico:


- Programado: 100%
- Real: 98.29%
- Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)
- 12,204 empleos generados
- +1 millón 400 mil habitantes beneficiados
- 2 hrs de ahorro en tiempo





Oaxaca Mitla-Entronque Tehuantepec II



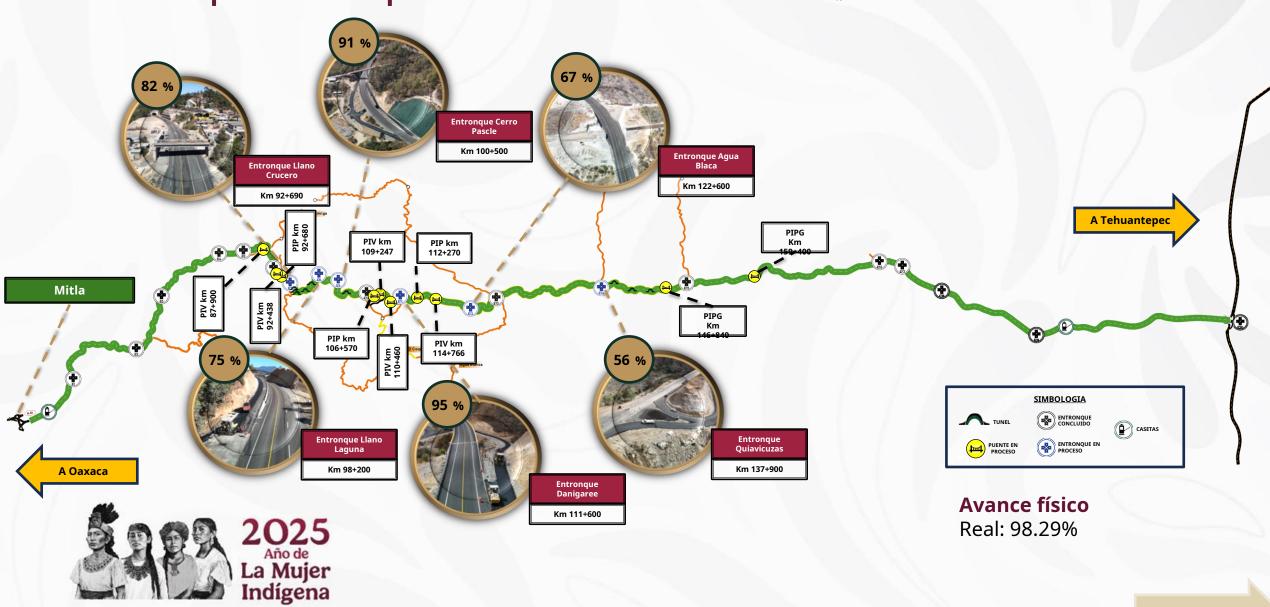

Obras de continuidad (en proceso) Mitla-Entronque Tehuantepec II





Problemática que impida concluir la obra

Demandas de comunidades para apoyo de obra social

El 24 de enero se puso en operación la troncal, quedando pendiente obra complementaria (entronques ,PIV', reforzamiento de puentes, estabilización de taludes y obra social) para poderla concluir al 100%.

Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI

Se requiere de asignación de recursos para la atención de estas obras. A la fecha se tiene un adeudo del mes de noviembre al mes de febrero del año en curso de 1,320.29 c/iva.

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	 169 km (carpeta troncal) 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques 21 pasos de servidumbre 2 casetas. 	 169.23 km 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 14 entronques 2 casetas. 	• 6 entronques • 21 pasos de servidumbre
Inversión (mdp)	29,749.20	26,346	3,403.20

Maquinaria: 75

- Excavadoras
- Tractores
- Motoniveladoras
- Plantas concreto
- Plantas asfalto


Fuerza de Trabajo:

1,100 personas



Oaxaca Mitla-Entronque Tehuantepec II



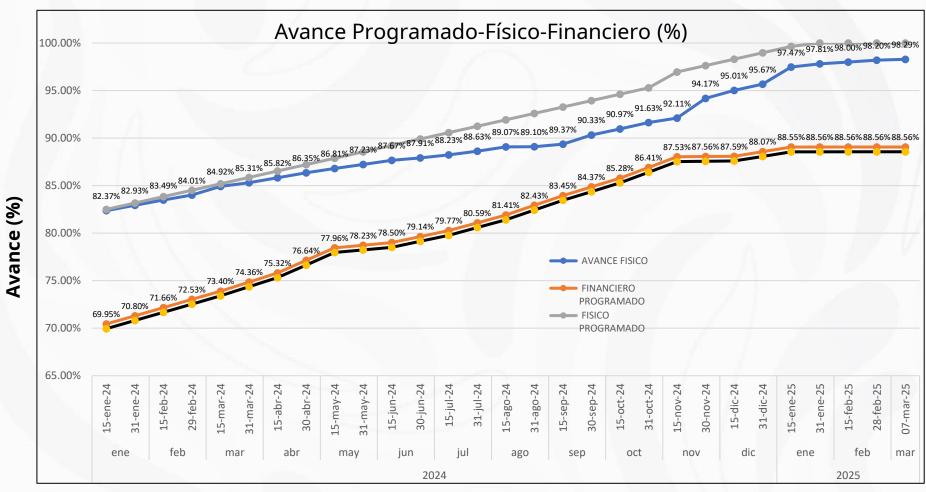



Quincenal
