## **Chiapas Entronque San Cristóbal**





Inversión: 44.96 mdp



Meta: 1 Entronque



**Avance físico:** 

• Real: 25.17%

• Financiero: 22.96%



Inicio:

**Término:** Por definir



**135** empleos generados




200,000 mil habitantes beneficiados



- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.



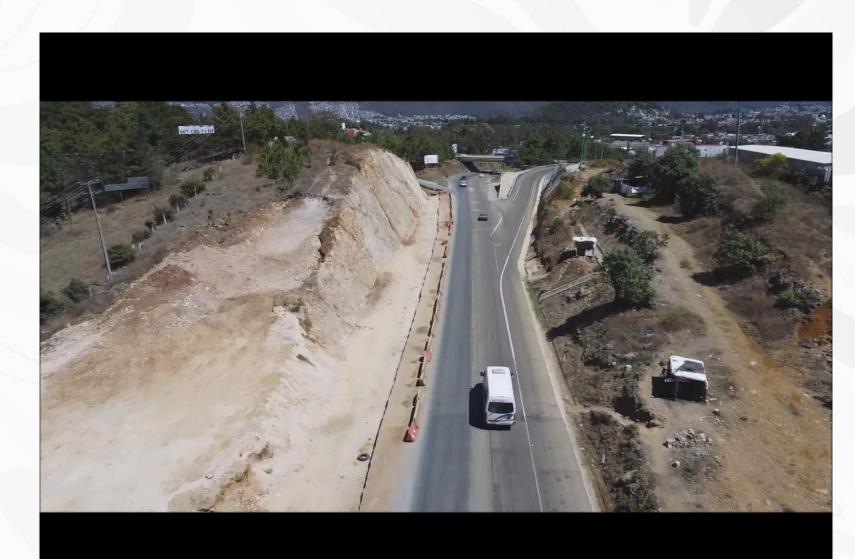

# **Programa de continuidad** Entronque San Cristóbal



	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	"Obras de Ampliación del tramo 3", consistente en la construcción de un Entronque que permita una conexión vial y el flujo de vehículos en diferentes direcciones. Su diseño y funcionamiento adecuados son fundamentales para garantizar la movilidad y la seguridad en el sistema de transporte.	0.25 km (equivalente)	0.75 km (equivalente)
Inversión (mdp) inc. I.V.A.	44.96	11.34	33.62
Maquinaria: 0		Fuerza de Trabajo:	

Fuerza de Trabajo:

0 personas


Problemática que impida	Propuesta solución que requiera apoyo
concluir la obra	del Secretario o SSI
La Concesionaria presento a la SICT, propuesta de modificación al proyecto ejecutivo del Entronque San Cristóbal.	Actualmente, continua en revisión la propuesta de modificación al proyecto del Entronque por parte de la DGST.
Programa de ejecución en	Una vez que se apruebe la modificación
suspensión temporal desde	propuesta por la Concesionaria al
el 31 de octubre de 2024	proyecto del entronque San Cristóbal, se
por modificación del	tendrán 4 meses para concluir los
proyecto.	trabajos.



#### Chiapas Entronque San Cristóbal



#### **Avance Programado - Físico - Financiero (%)**

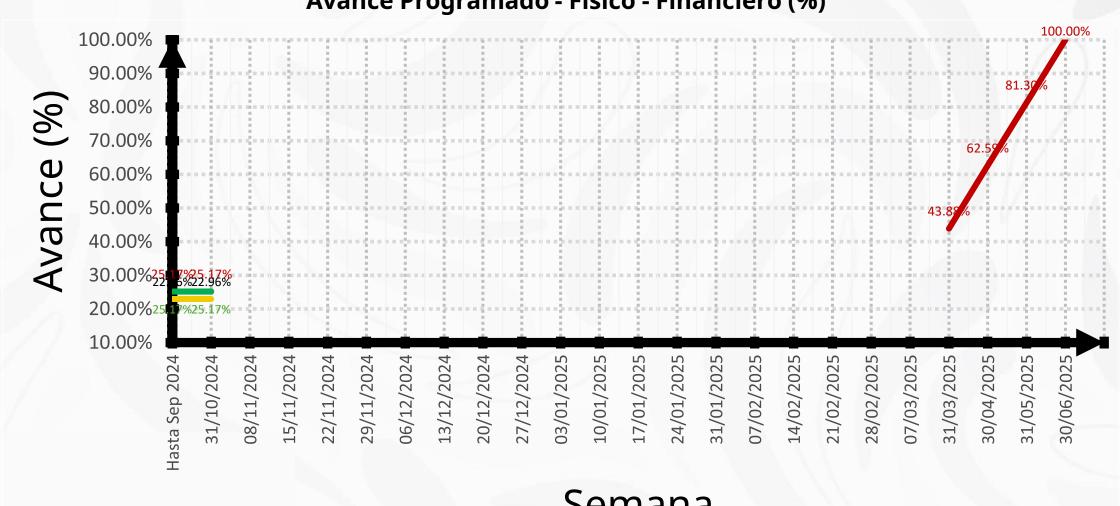

Semana

### **Entronque San Cristóbal**



#### Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV





